

- A.F.D.J.R.A. GALAȚI -		
AGENȚIA CĂI NAVIGABILE CĂLĂRAȘI		
INTRARE NR.	4523	
IEȘIRE	3	
Ziua	Luna	Anul
23	08	2017

CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

- 1. Denumire produse/cantități:** Spatiu cazare modular(container): 1 buc. cu 4 module.
- 2. Caracteristici tehnice:** Amplasarea se va face pe actuala fundatie de 8m/10m(inaltimea fundatiei fiind de 1,4m) aflata la punctul de lucru: Statia Semaforica Izvoarele; sat Izvoarele , comuna Lipnita, jud. Constanta
 - a: structura metalica sablata si grunduita
 - b: protectie anticoroziune
 - c: culoare standard poliuretanică
 - d: peretii exteriori din panouri sandwich, cu grad mare de rezistenta la incendiu
 - e: usile si geamurile din termopan cu ruloari si plase tantari; cu exceptia usii de la intrare , ce va fi metalica
 - f: instalatia electrica: tensiune de lucru 380V, prizele si tabloul sigurante automate cu impamantare; cablurile vor fi aparente prin tubulatura metalica cu legaturi sudate (numarul prizelor sunt conform schita)
 - g: dotari: 1-biroul va fi dotat cu 6 prize, calorifer si instalatie de iluminat;
2-dormitorul va fi dotat cu 2 prize, calorifer si instalatia de iluminat;
3-baia va fi dotata cu boiler, calorifer, dus, wc, chiuveta baie si instalatie pentru masina de spalat (3 prize si inst de iluminat);
4-bucataria va fi dotata cu chiuveta bucatarie, calorifer , 4 prize si instalatia de iluminat;
5-zona de cazare a personalului ridicari topohidrografice si semnalizare va fi dotata cu calorifer, aer conditionat 12000btu , instalatie iluminat si 4 prize
- 1. Destinația finală:** Agenția Cai Navigabile Calarasi , str. Dobrogei nr.1 Punct de lucru Statia Semaforica Izvoarele , sat Izvoarele, Comuna Lipnita, jud. Constanta.
- 2. Termen de livrare:** Produsele vor fi livrate (și instalate) după data intrării în vigoare a contractului: în maxim 30 zile lucratoare
- 3. Perioada de garanție:**

Perioada de garanție solicitată de achizitor este de minim 24 luni.
Perioada de garanție începe cu data recepției (după punerea în funcțiune și instruirea personalului).
- 4. Recepția :**

Receptia: va fi cantitativă și calitativă.

Dacă produsele verificate nu corespund, A.F.D.J. R.A. Galati are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a le înlocui pentru ca acestea să corespundă tuturor specificațiilor tehnice solicitate de A.F.D.J. R.A. Galați.

5. Obligațiile furnizorului:

Furnizorul are obligația de a furniza produsele cu promptitudinea cuvenită în concordanță cu termenele de livrare și cu respectarea caracteristicilor tehnice solicitate. Produsele furnizate, în baza contractelor, vor respecta caracteristicile tehnice prezentate de către furnizor în oferta tehnică, cu respectarea normelor tehnice, a normelor europene – naționale și locale în vigoare pentru asigurarea calității, normele europene – naționale și locale în vigoare pentru protecția mediului, normele de securitate și sănătate în muncă și normele PSI.

Produsele vor avea marcaje CE și etichete în limba română.

Cartea/cărțile tehnice și instrucțiunile de utilizare, depozitare, montare, întreținere și reparare vor fi în limba română.

Mențiuni:

Condițiile impuse de cerințele Caietului de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor Caietului de sarcini.

Sef sectie/agentie




Sef Serviciu/birou/compart.

A handwritten signature in black ink.

Intocmit si redactat,
N.B./Birou F.H.S.S.R /1 ex./ data 23.08.2017

ANEXA 1

CALORIFER

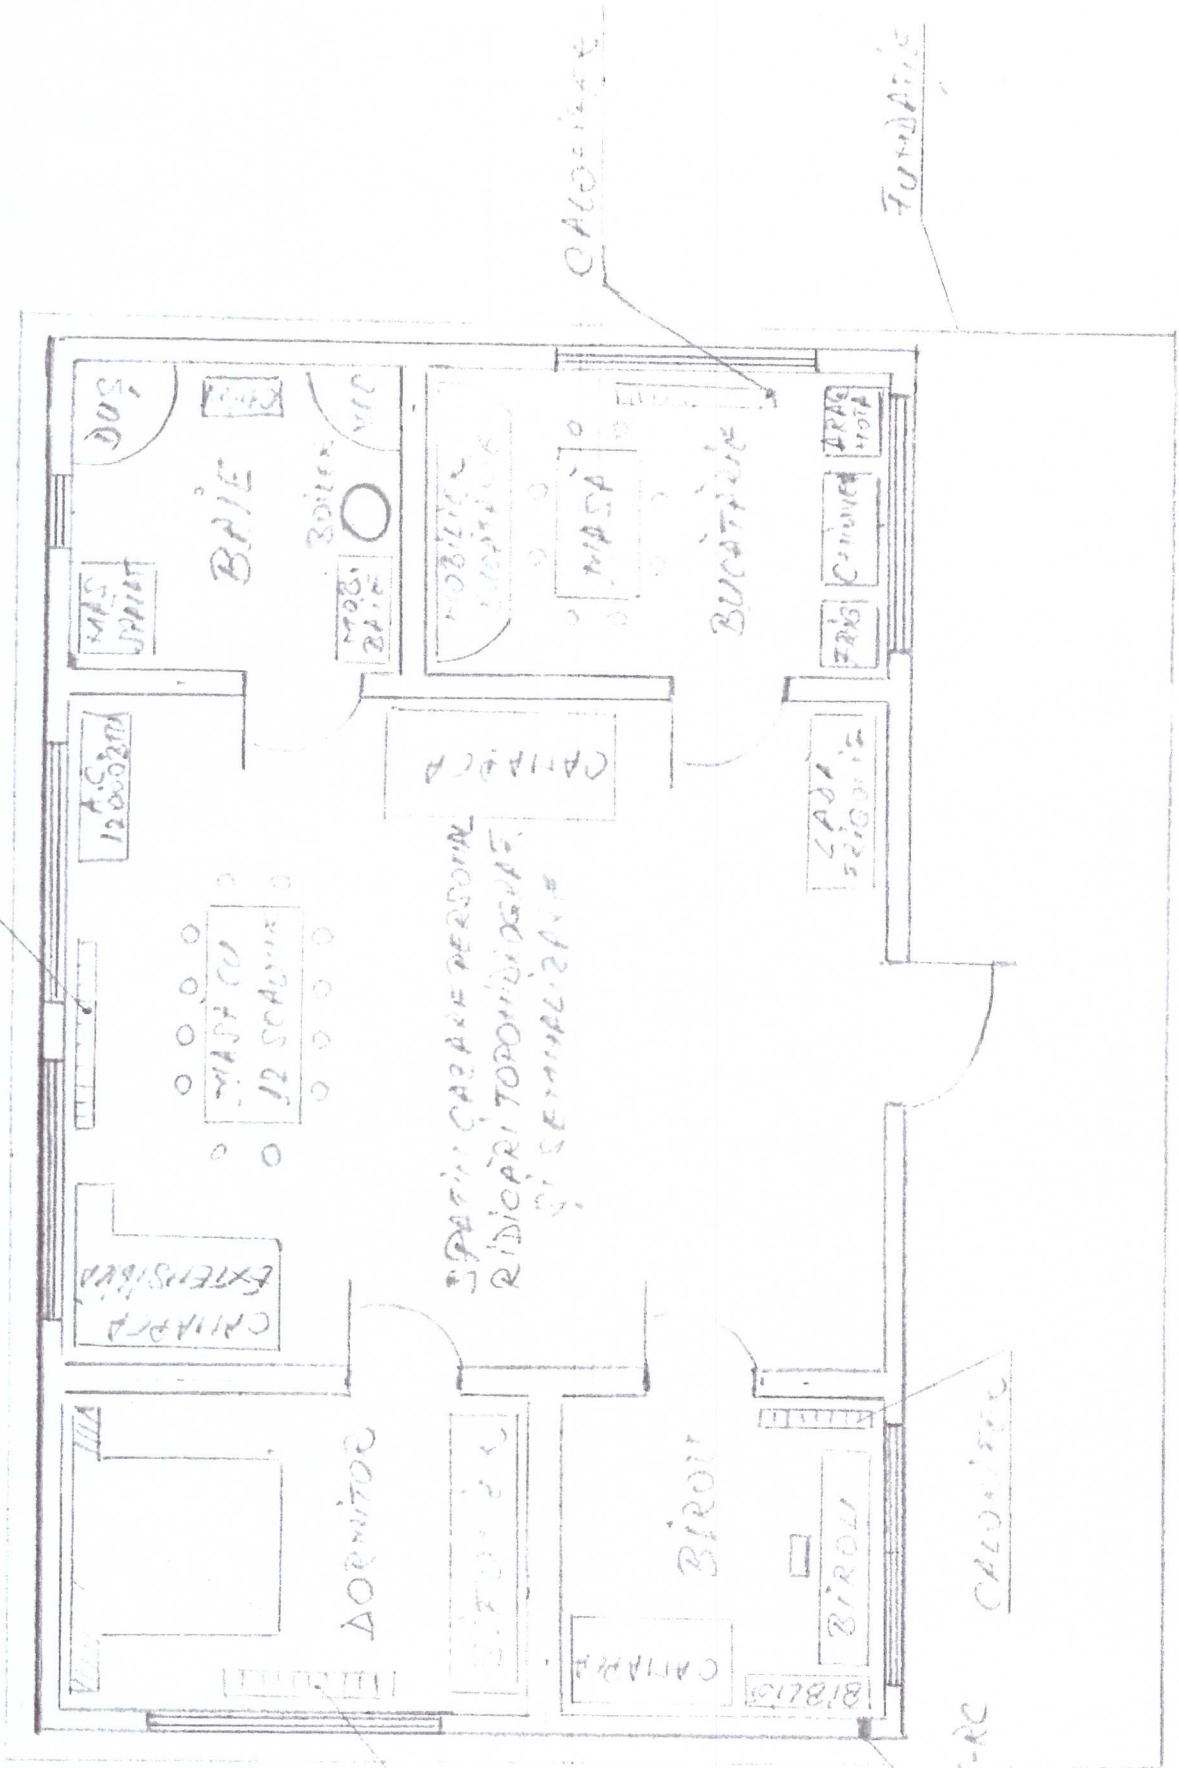

Intrare cobor
Intrare etaj superior

CALORIFER

CALORIFER

CALORIFER

FUNDATIE
